Gerenciamento do MVP com Scrum e estimativas por Planning Poker

Enunciado do trabalho avaliativo — base: Especificação de Requisitos do MVP "Sistema de Monitoramento de Tempo Parado em Roteiros"

VALOR	ENTREGA	EQUIPE	FERRAMENTAS
5,0 pontos	15/10/2026	máx. 4 alunos	Scrumwise · Scrumpoker-online

Prof. Sandro Laudares — dúvidas: **Laudares@pucminas.br**

1. Objetivo do trabalho

Neste trabalho, seu grupo vai **gerenciar a construção do MVP "Sistema de Monitoramento de Tempo Parado em Roteiros"** (especificação anexa) usando o framework **Scrum**. O grupo não vai implementar o sistema: vai **planejar e organizar o trabalho como um time ágil faria** — montando o Product Backlog, planejando duas Sprints e estimando as histórias com **Planning Poker** —, tudo em ferramentas online reais, com **evidências em prints de tela**.

Ao final do trabalho, o grupo terá produzido:

- Um **Product Backlog priorizado** no Scrumwise, cobrindo os requisitos funcionais (RF01–RF12) da especificação;
- **Duas Sprints de 7 dias**, configuradas com datas e com os itens distribuídos;
- **Estimativas de todas as histórias por Planning Poker**, realizadas no Scrumpoker-online.org e registradas no Scrumwise;
- Um **relatório curto com prints de tela** de tudo o que foi feito.

> **REGRA GERAL**
> Grupos de **NO MÁXIMO 4 ALUNOS** · valor **5,0 PONTOS** · entrega até **15/10**, em PDF, pelo canal indicado pelo professor. Os prints deste enunciado são **EXEMPLOS ILUSTRATIVOS DAS TELAS DOS APPS, MONTADOS COM OS DADOS DE REFERÊNCIA DO TRABALHO** — os prints do grupo devem mostrar **O PROJETO DE VOCÊS** no app real, com o nome do grupo visível.

2. As ferramentas do trabalho

Ferramenta	Para que o grupo vai usar
Scrumwise `www.scrumwise.com`	Criação do projeto, do **Product Backlog** e das **2 Sprints de 7 dias**, quadro Scrum de tarefas e campo de estimativas em story points. Possui período de teste gratuito (“Try Now Free”), sem necessidade de cartão.
Scrumpoker-online `www.scrumpoker-online.org/pt/`	Sessões de **Planning Poker**: sala online gratuita (sem cadastro), cartas na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), votação em segredo e revelação dos resultados. O grupo entra por link, ID da sala ou QR code.

As duas ferramentas funcionam direto no navegador. É obrigatório usá-las: trabalhos com backlog em outro formato (planilha, documento de texto, Trello etc.) **não serão aceitos**.

3. Etapa A — Product Backlog e Sprints no Scrumwise

OBRIGATÓRIO Todo o gerenciamento do backlog e das sprints deve ser feito no app `https://www.scrumwise.com/`.

1 **Crie o projeto do grupo.** Acesse `www.scrumwise.com` e clique em **Try Now** para criar a conta do grupo (gratuita). Depois, convide os outros membros da equipe para o projeto. O nome do projeto deve identificar o grupo, por exemplo: *"MVP Tempo Parado — Grupo 7 (Ana, Bruno, Carla, Diego)"*.

2 **Monte o Product Backlog.** Na seção de backlog, crie **um backlog item (história) para cada requisito funcional RF01–RF12** da especificação, redigido no formato *"Como <papel>, quero <o quê> para <valor>"*. Exemplo: *"Como gerente, quero um dashboard com o tempo parado por dia, por mês e por período, para identificar gargalos das rotas"* (RF08).

3 **Priorize o backlog.** Ordene os itens com os de prioridade **Alta** no topo (RF01–RF08), depois os **Média** (RF09–RF11) e por fim o **Baixa** (RF12). Use as Regras de Negócio (RN01–RN07) como critérios de aceitação na descrição dos itens relacionados.

4 **Crie as duas Sprints de 7 dias.** Na seção de sprints, adicione a **Sprint 1** e a **Sprint 2**, cada uma com **duração de 7 dias corridos** e datas preenchidas (sugestão: Sprint 1 de 16/10 a 22/10 e Sprint 2 de 23/10 a 29/10 — o grupo pode ajustar as datas, mas não a duração de 7 dias).

5 **Distribua os itens nas sprints.** Arraste as histórias do backlog para dentro de cada sprint, respeitando a prioridade e as dependências (por exemplo, os cadastros RF01–RF04 precisam vir antes do dashboard RF08). Deixe no backlog itens de prioridade Baixa que couberem para depois.

6 **Detalhe o quadro Scrum.** Para os itens da Sprint 1, crie as tarefas de execução no Scrum Board (colunas tipo *To Do / In Progress / Done*), por exemplo: modelar o banco, implementar o cadastro de pontos, testar o cálculo do tempo parado (conforme RN02 e RN03).

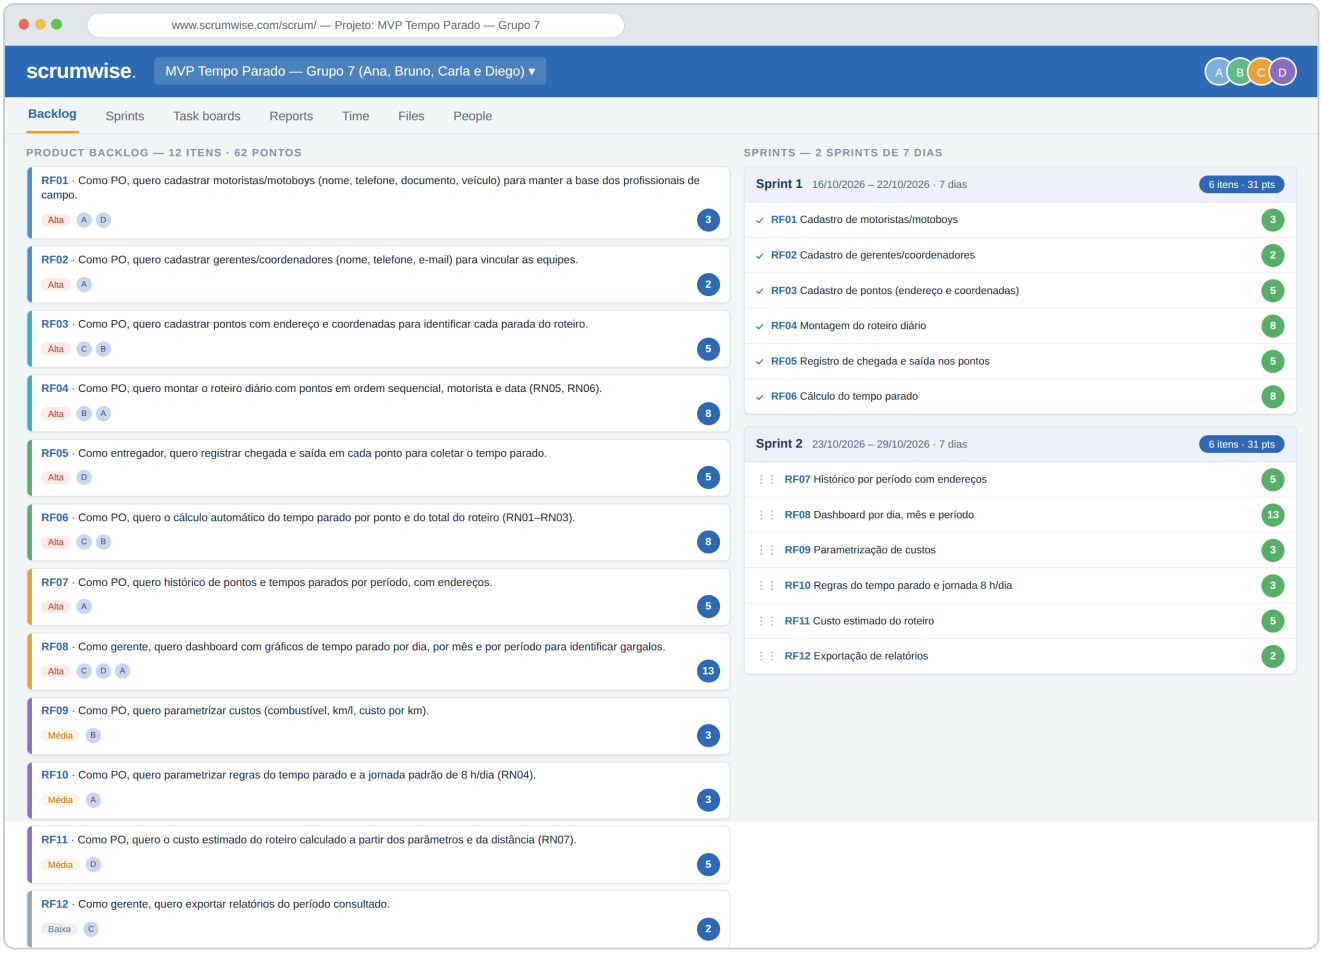


Figura 1 — Tela do **Product Backlog e planejamento das sprints** no Scrumwise: à esquerda as 12 histórias (RF01–RF12) com story points e prioridade; à direita as duas sprints de 7 dias com os itens distribuídos. (Exemplo ilustrativo com os dados de referência do trabalho)

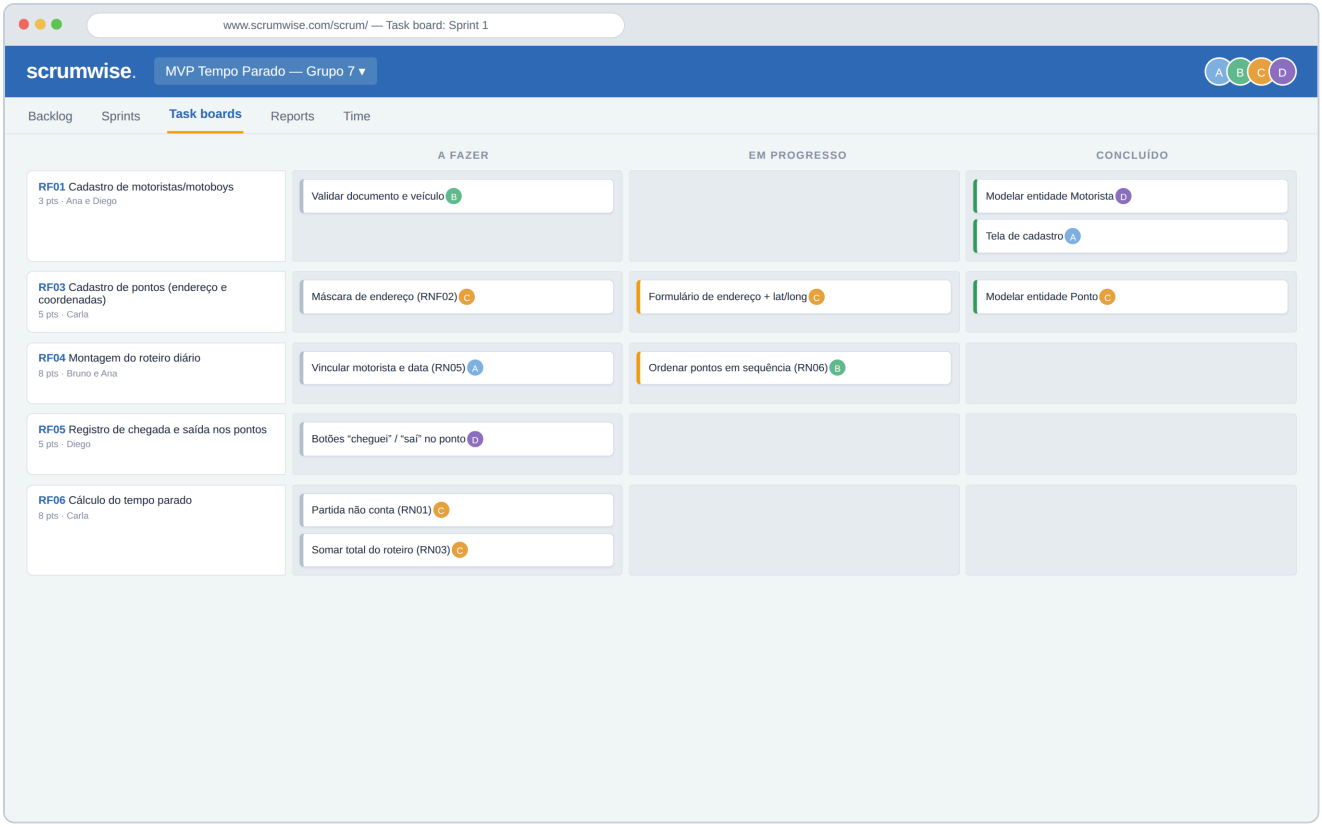


Figura 2 — Tela do **Task Board da Sprint 1** no Scrumwise: uma linha por item de backlog e as tarefas distribuídas nas colunas A Fazer, Em Progresso e Concluído. (Exemplo ilustrativo com os dados de referência do trabalho)

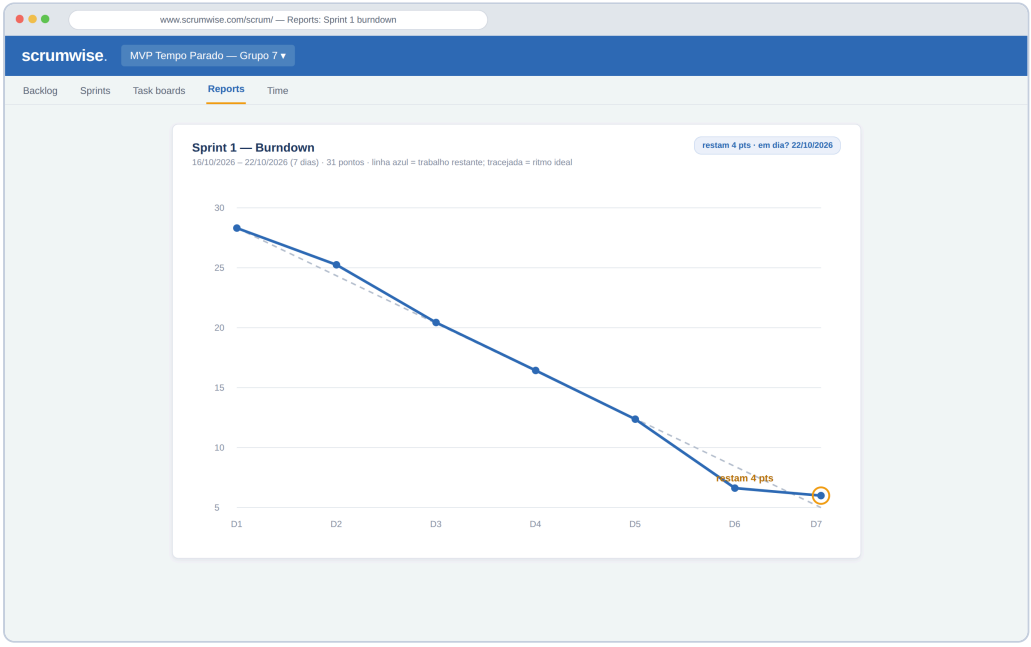


Figura 3 — Burndown da Sprint 1 no Scrumwise, gerado a partir dos story points das histórias (31 pts em 7 dias). (Exemplo ilustrativo com os dados de referência do trabalho)

4. Etapa B — Estimativas por Planning Poker no Scrumpoker-online

OBRIGATÓRIO As estimativas devem ser feitas em sessão coletiva no app `https://www.scrumpoker-online.org/pt/`, com **todos os membros do grupo votando**.

1 **Abra uma sala.** Acesse `https://www.scrumpoker-online.org/pt/` e crie uma sala (não precisa de cadastro — é gratuito).

2 **Convoque o grupo.** Compartilhe o **link da sala, o ID ou o QR code** com os membros; cada um entra identificando-se com o próprio nome. Nos prints, deve dar para ver os nomes de todos os membros online na sala.

3 **Estime cada história.** O moderador (o Product Owner ou Scrum Master do grupo) apresenta a história do backlog; cada membro **vota em segredo** com as cartas da sequência de Fibonacci: **1, 2, 3, 5, 8, 13, 21**.

4 **Revele e discuta.** Quando todos votarem, o moderador **revela as cartas**. Se houver divergência, os membros com os votos mais distantes explicam o porquê e o grupo vota novamente (máximo de 2 rodadas por história) até chegar ao **consenso**, que é o número registrado.

5 **Transcreva para o Scrumwise.** Ao fim de cada história, registre o número consensado no **campo de estimativa (story points) do item correspondente no Scrumwise**. O backlog final deve ter **todas as histórias estimadas**.

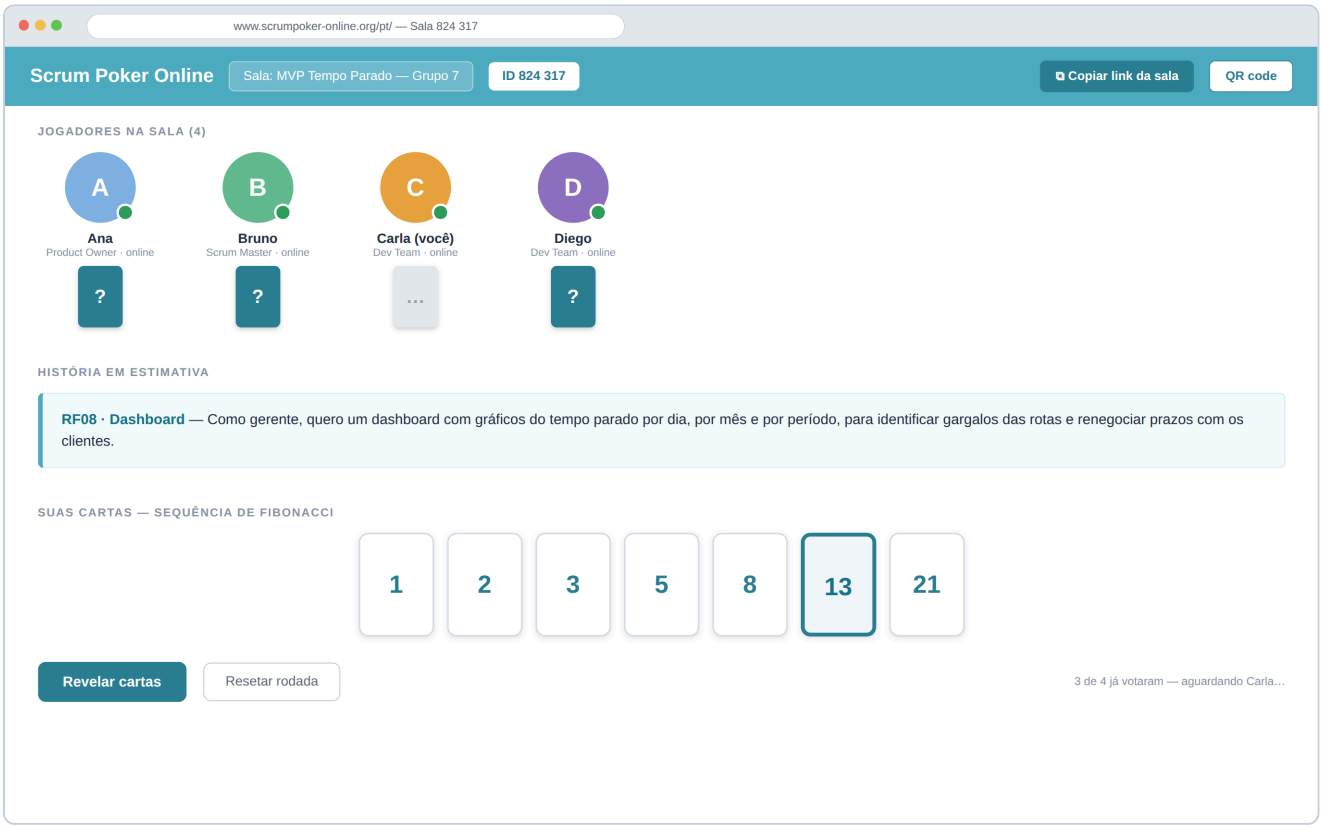


Figura 4 — Sala do **Scrumpoker-online** com o grupo reunido: jogadores online, história em estimativa (RF08) e as cartas de Fibonacci para o voto secreto. (Exemplo ilustrativo com os dados de referência do trabalho)

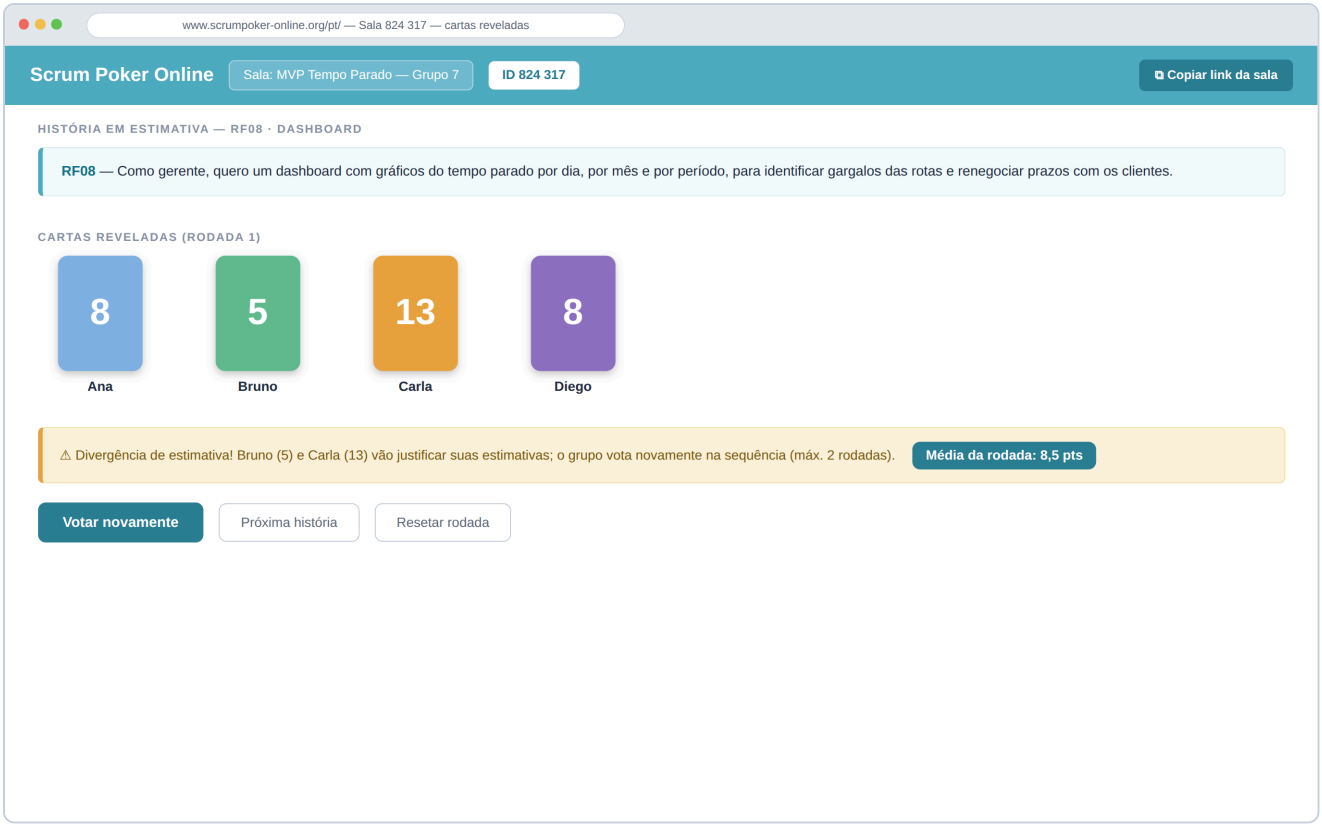


Figura 5 — Revelação das cartas no Scrumpoker-online: divergência (5, 8, 8, 13) a ser discutida pelo grupo até o consenso. (Exemplo ilustrativo com os dados de referência do trabalho)

DICA DE CONDUÇÃO

Estimem primeiro as histórias de maior prioridade (Alta) e deixe registrada **PELO MENOS UMA RODADA COM DIVERGÊNCIA** (cartas diferentes reveladas), com um print da discussão — isso faz parte da avaliação, pois mostra o ritual do Planning Poker de verdade.

5. O que entregar (relatório em PDF)

O grupo entrega **um único PDF**, com capa contendo disciplina, nomes e matrículas de todos os membros, e o **link do projeto no Scrumwise** com permissão de leitura para o professor. O relatório deve conter:

☑ **Print do Product Backlog completo** no Scrumwise, com as 12 histórias (RF01–RF12), a ordenação por prioridade e os story points visíveis;

☑ **Print das 2 Sprints** criadas, mostrando as **datas de 7 dias** de cada uma e os itens distribuídos;

☑ **Print do Scrum Board da Sprint 1**, com as tarefas de execução dos itens;

☑ **Prints do Planning Poker**: a sala com todos os membros online, uma votação em andamento (cartas não reveladas) e pelo menos **duas revelações** (sendo uma com divergência de cartas);

☑ **Tabela-resumo** das estimativas (modelo abaixo);

☑ **Reflexão da equipe** (até 10 linhas): quais histórias geraram maior divergência de estimativa e como o grupo chegou ao consenso.

Modelo da tabela-resumo (obrigatória)

História (RF)	Descrição curta	Prioridade	Story points (consenso)	Sprint	Responsável(is)
RF01	Cadastro de motoristas/motoboys	Alta	3	1	—
RF08	Dashboard por dia/mês/período	Alta	13	2	—
…	…	…	…	…	…

Os valores acima são apenas ilustração do formato — o grupo deve preencher com os **resultados reais da sua sessão de Planning Poker**.

6. Critérios de avaliação

Critério	Pontos
Product Backlog completo e priorizado no Scrumwise: as 12 histórias (RF01–RF12) no formato “Como… quero… para…”, com critérios de aceitação baseados nas RN01–RN07.	1,5
Sprints: duas sprints de **7 dias** configuradas com datas no Scrumwise e itens distribuídos de forma coerente com a prioridade e as dependências.	1,0
Planning Poker: evidências da sala, dos nomes do grupo, da votação, da revelação e da resolução de divergências no Scrumpoker-online; estimativas finais registradas em todas as histórias do Scrumwise.	1,5
Tabela-resumo consistente com os prints + reflexão da equipe sobre a sessão de estimativas.	0,5
Qualidade e organização da entrega: prints legíveis, identificando o projeto do grupo, relatório bem estruturado e entregue no prazo (15/10).	0,5
Total	**5,0**

Regras finais

- Equipes de **no máximo 4 alunos**; todos os membros devem aparecer votando nos prints do Planning Poker;
- Prints **copiados de outro grupo** ou das imagens ilustrativas deste enunciado anulam o critério correspondente (e podem zerar o trabalho, conforme política da disciplina);
- A sessão de Planning Poker é **coletiva** (todos online na mesma sala, ao mesmo tempo) — registrem data e hora;
- Entrega até **15/10**, pelo canal indicado pelo professor; atrasos seguem a política de prazos da disciplina.
